




MUNICIPIO DE SAN FELIPE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS PUBLICOS		DATOS				NO. CONTRATO IS-CMFSF-FAIS-001-2023
		OBRA: "REHABILITACION PARQUE RUBEN DOMINGUEZ" RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023 CONTRATISTA: CONTRUCCIONES MILLANES				
CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	VOLUMEN REQUERIDO	VOLUMEN INSTALADO	AVANCES EN PORCENTAJE	
A	REHABILITACION DE BAÑOS					
1.1	Demolicion de techo incluye: limpieza, acarreo de escombros al basurero municipal, y herramienta para su correcta ejecucion	M2	22	22	100%	
1.2	Limpieza del area de baños incluye: acarreo de la misma, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	22	22	100%	
1.1	Techo en lámina galvanizada de 12 pies, losa a base de barrotes de 2x6 pulgadas para recibir lámina galvanizada con volado de 1 pie en ambos sentidos de caída incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	22			
1.2	instalacion de durock incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	22			
1.1	Aplicación de base para pintura y pintura vinil acrílica incluye: materiales, herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	155			
1.2	Fabricacion e instalacion de puerta de acero con cerrojo de seguridad medida estandar incluye: materiales, herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	2			
1.3	Instalacion de sanitarios completos con deposito de agua, mangueras, llaves de angulo, tapaderas, asientos, anclajes, bases anillos de ceras. Incluye materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalacion.	PZA	5			
1.4	Instalacion de migtorio con fluxometro manual como incluye materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalacion.	PZA	1			
1.5	Instalacion de lavamanos con llaves mezcladoras, mangueras, llaves de angulo incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalacion.	PZA	4			
1.6	Instalacion de loseta en base muro de concreto existentes de base de lavamanos incluye: loseta, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	14			
	Rehabilitacion de puertas de metal de baño existentes, con pintura 2 manos, reparacion y aplicacion de soldadura si se requiere incluye: mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	5			
1.7	Aplicación de pintura tráfico color gris sobre piso incluye: pintura, materiales herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	22			


CONSEJO MUNICIPAL FUNDACIONAL DE SAN FELIPE,

B.C.

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SAN FELIPE
REPORTE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

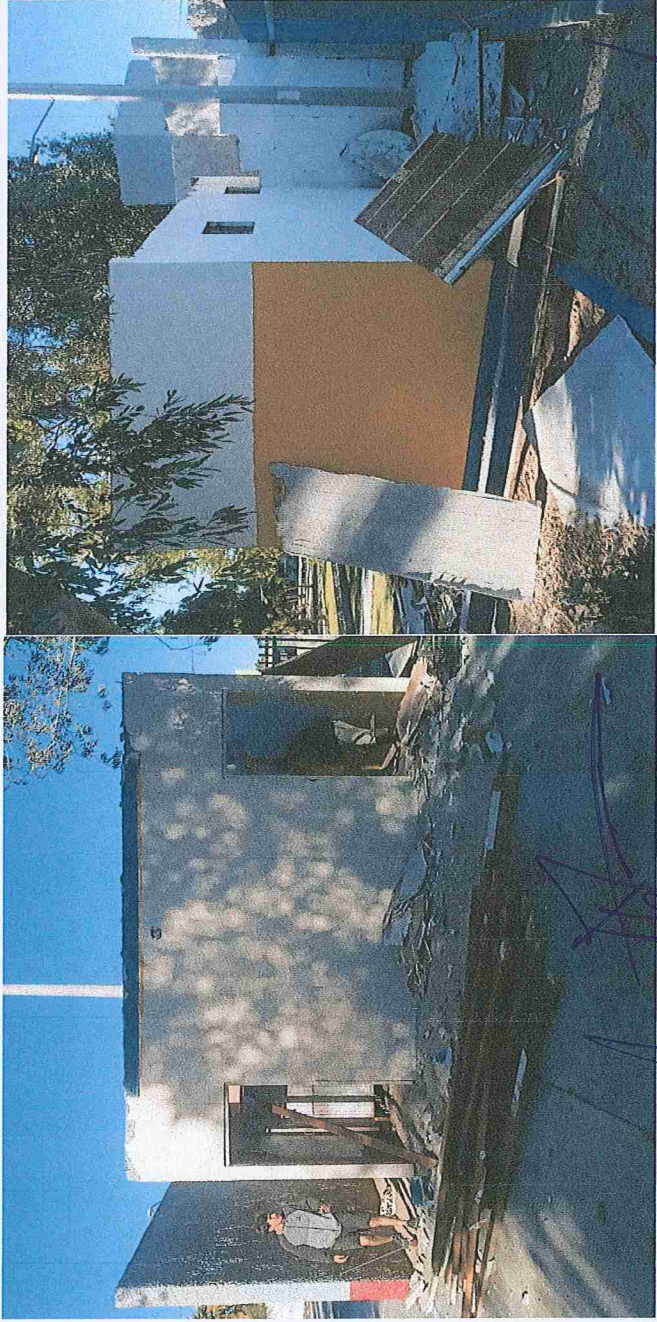

NOMBRE O DENOMINACION	
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DEL PARQUE RUBEN DOMINGUEZ CONTRATISTA. HECTOR MILLANES—MILLANES CONSTRUCCION	
REPORTE FOTOGRAFICO	DESCRIPCION DE LA OBRA
	PRIMERA ETAPA. SE REALIZO DEMOLICION DE TECHO, ACARREO DE ESCOMBRO. LIMPIEZA EN EL AREA DE BAÑOS


REVISO


APROBO
